Tidsplan

d. 21-07-17 — Søndre strand - Fjernelse af nordlige høfde — AARSLEFF

Id	Opgavetil	Opgavenavn	Varighed	Startdato	Slutdato
1		**Søndre strand - Fjernelse af nordlige høfde**	**30 dage**	**ma 31-07-17**	**ti 19-09-17**
2		**1. Anstilling**	**1 dag**	**ma 31-07-17**	**ma 31-07-17**
3		Etablering af byggeplads og anstilling af maskiner	1 dag	ma 31-07-17	ma 31-07-17
4		**2. Opgravning og sortering af Nordlige høfde**	**16 dage**	**ti 01-08-17**	**ma 28-08-17**
5		Rækværk, høfdeblokke og badeplatform deponeres	6 dage	ti 01-08-17	on 09-08-17
6		Mole bortgraves og sorteres samt genetableres ved afslutning	10 dage	to 10-08-17	ma 28-08-17
7		**Byggemøde**	0 dage	fr 11-08-17	fr 11-08-17
8		**3. Opgravning, flytning og levering af sand**	**13 dage**	**ti 29-08-17**	**ti 19-09-17**
9		Opgravning og flytning af 4.000m3 sand	8 dage	ti 29-08-17	ma 11-09-17
10		Levering og indbygning af 2.000m3 sand (Se forklaring nedenfor)	5 dage	ti 12-09-17	ti 19-09-17

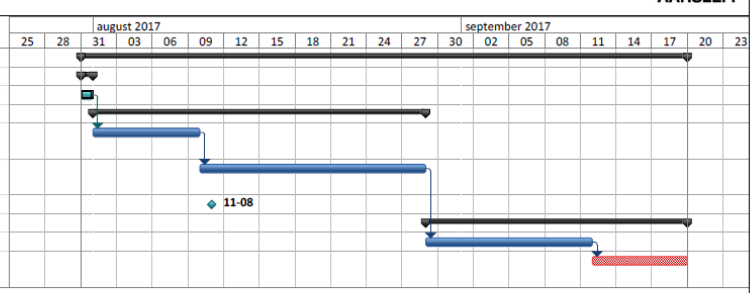

Punkt ID 10:
Dette arbejdes omfang afventer reguleringen af de 4000m3 sand.

Opgave	Eksterne opgaver	Manuel opgave	Kun slutdato		
Opdeling	Ekstern milepæl	Kun varighed	Deadline		
Milepæl	Inaktiv opgave	Manuel oversigtsopløftning	Fremdrift		
Hovedopgave	Inaktiv milepæl	Manuel oversigt			
Projektoversigt	Inaktiv oversigt	kun start			
